

Room8 Project-plan-v0.1

Μέλη ομάδας:

Μελάνης Γεώργιος,1067378,st1067378@ceid.upatras.gr Ρέρρας Νικόλαος,1067411, st1067411@ceid.upatras.gr Ταμπαξής Γεώργιος,1072487, st1072487@ceid.upatras.gr

Τη συγγραφή και τον ποιοτικό έλεγχο του παρακάτω κειμένου επιμελήθηκαν όλα τα μέλη.

• Τυπικά υποέργα

Πίνακας περιγραφής τυπικών υποέργων:

Τυπικό υποέργο	Περιγραφή τυπικού υποέργου		
TY1	ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΕΩΝ		
TY2	ΑΝΑΛΎΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΏΝ ΙΔΕΏΝ		
TY3	ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
TY4	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
TY5	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ GUI		
TY6	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ		
TY7	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ MODULES		
TY8	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ		
TY9	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ LOGIN MODULE		
TY10	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SIGN-UP MODULE		
TY11	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ QUESTIONNAIRE MODULE		
TY12	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ HASHOME MODULE		
TY13	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ LOOKINGFORHOME MODULE		
TY14	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CHAT MODULE		
TY15	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PAIRING MODULE		
TY16	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ GUI		
TY17	ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΗΣ-ΚΩΔΙΚΑ		
TY18	ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΩΔΙΚΑ-GUI		
TY19	DEBUG		
TY20	ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ		

• Εξαρτήσεις τυπικών υποέργων

Πίνακας εξαρτήσεων τυπικών υποέργων:

Τυπικό υποέργο	Προαπαιτούμενα τυπικά υποέργα
TY1	-
TY2	TY1
TY3	TY2
TY4	TY2
TY5	TY4
TY6	TY4
TY7	TY4
TY8	TY6
TY9	TY7
TY10	TY7
TY11	TY7
TY12	TY7
TY13	TY7
TY14	TY7
TY15	TY7
TY16	TY5
TY17	TY8, TY9, TY10, TY11, TY12, TY13, TY14, TY15
TY18	TY16, TY17
TY19	TY17, TY18
TY20	TY18,TY19

• Χρονοπρογραμματισμός τυπικών υποέργων


Πίνακας χρονοπρογραμματισμού τυπικών υποέργων:

Τυπικό Υποέργο	Διάρκεια (σε μέρες)	Έναρξη	Λήξη
TY1	1	1/3/2023	1/3/2023
TY2	1	1/3/2023	1/3/2023
TY3	1	1/3/2023	1/3/2023
TY4	3	2/3/2023	4/3/2023
TY5	3	7/3/2023	9/3/2023
TY6	4	10/3/2023	13/3/2023
TY7	5	16/3/2023	20/3/2023
TY8	10	23/3/2023	1/4/2023
TY9	2	2/4/2023	3`/4/2023
TY10	2	4/4/2023	5/4/2023
TY11	3	6/4/2023	8/4/2023
TY12	3	9/4/2023	11/4/2023
TY13	4	12/4/2023	15/4/2023
TY14	8	12/04/2023	19/04/2023
TY15	4	19/4/2023	22/4/2023
TY16	9	23/4/2023	1/5/2023
TY17	9	2/5/2023	10/5/2023
TY18	9	11/5/2023	19/5/2023
TY19	8	20/5/2023	27/5/2023
TY20	6	28/5/2023	2/6/2023


• Διαγράμματα Gantt και Pert

Τα παρακάτω διαγράμματα Gantt και Gantt αποτελούν μία ρεαλιστική απεικόνιση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου εάν ξεκινάγαμε πραγματικά από την Τετάρτη 01/03/2023 να το υλοποιούμε.Το <u>Gantt</u> σχεδιάστηκε με το **Microsoft Project** και το <u>Pert</u> με το **Microsoft Visio**.

Διάγραμμα Gantt:

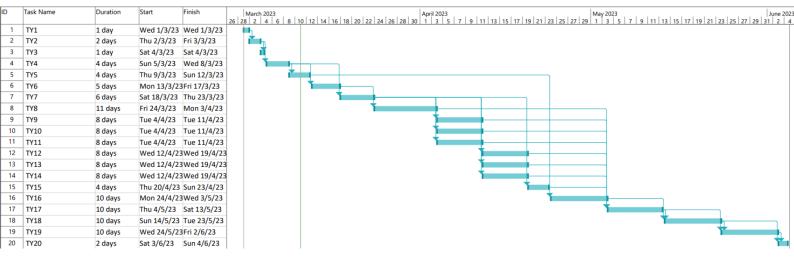


Διάγραμμα Pert:

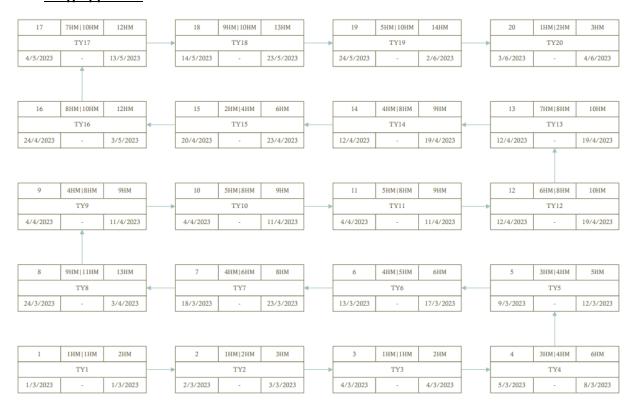



• Ανάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό

Όπως έχει αναλυθεί και στο **Team-plan-v0.1** στην ενότητα μοντέλο εργασίας όλα τα μέλη της ομάδας έχουμε συμφωνήσει ομόφωνα ότι η προσπάθεια όλων μας θα είναι ισοδύναμη. Συνεπώς, η ανάθεση του έργου θα είναι ισομερώς μοιρασμένη σε όλους μας. Αυτό αποτυπώνεται και στα παρακάτω διαγράμματα Gantt διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για τον καθένα μας.

(Αγνοώντας αργίες,Σαββατοκύριακα και την παράταση μιας βδομάδας του 1^{ου} Παραδοτέου,εμείς ακολουθούμε το αρχικό μας πλάνο σαν να μην είχε δωθεί παράταση.)

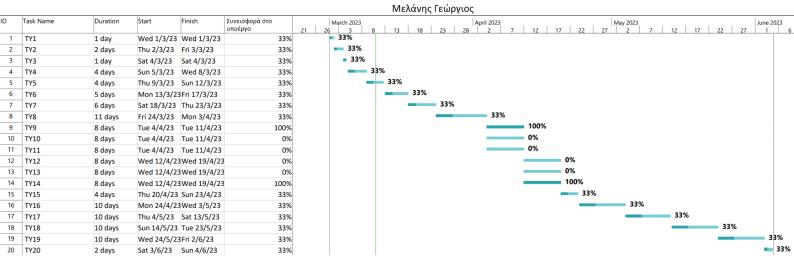

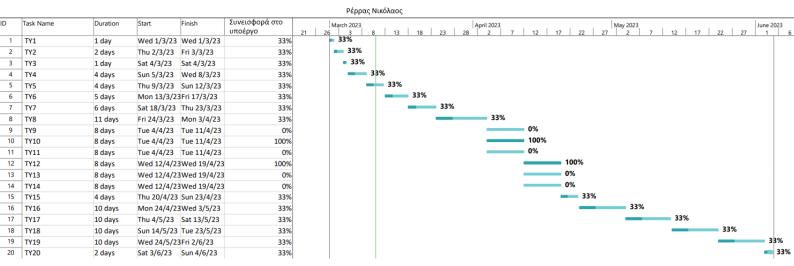

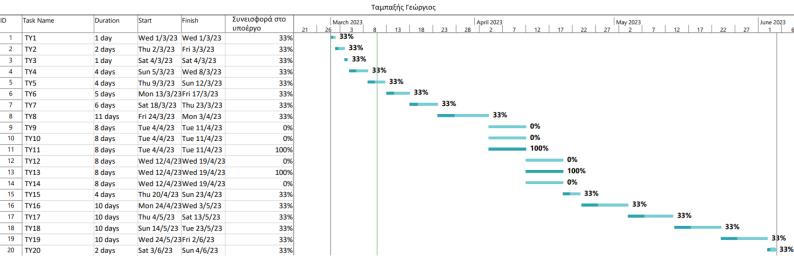

• Εκτίμηση κόστους

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με τα προβλεπόμενα έξοδα υλοποίησης του έργου μας. Για διευκρίνιση, με τον όρο Backup budget αναφερόμαστε σε ένα ποσό χρημάτων το οποίο θα μπορεί να διατεθεί άμεσα για να καλύψει κενά ή απρόσμενες αυξήσεις στα αρχικώς εκτιμώμενα κόστη.

Περιγραφή κόστους	Εκτίμηση κόστους	Σύνολο
Μισθός 3 ατόμων για 3 μήνες	1500€ ανά άτομο	4500€
Χώρος εργασίας για 3 μήνες		2100€
Ενοίκιο	350€ ανά μήνα	
Πάγια έξοδα χώρου	350€ ανά μήνα	
Λογισμικό		
Microsoft 365 Subscription	18,60€ ανά άτομο για 3 μήνες	
Microsoft Visio Subscription	15€ ανά μήνα	1146€
Microsoft Project Subscription	55€ ανά μήνα	
Visual Studio Enterprise Subscription	250€ ανά μήνα	
Αγορά Server	2500€	2500€
Συντήρηση Συστημάτων	500€	500€
Backup budget (ως εγγύηση σε	1000€	1000€
περίπτωση που χρειαστεί)		
		11.746€
