

Room8 Project-plan-v0.2

Μέλη ομάδας:

Μελάνης Γεώργιος,1067378,st1067378@ceid.upatras.gr Ρέρρας Νικόλαος,1067411, st1067411@ceid.upatras.gr Ταμπαξής Γεώργιος,1072487, st1072487@ceid.upatras.gr

Τη συγγραφή και τον ποιοτικό έλεγχο του παρακάτω κειμένου επιμελήθηκαν όλα τα μέλη.

Αλλαγές από έκδοση ν0.1 σε έκδοση ν0.2

Λόγω των αλλαγών που κρίναμε αναγκαίο να γίνουν στο Project-description-v0.1 πρέπει αναγκαστικά να γίνουν και οι αντίστοιχες αλλαγές στα τυπικά υποέργα του έργου μας.Συγκεκριμένα οι αλλαγές που έγιναν είναι:

- Προσθήκη Verification module
- Προσθήκη SelectCategory module
- Προσθήκη Questionnaire Team A module και Questionnaire Team B module.
- Προσθήκη SubmitHome module
- Προσθήκη HousePreferences module
- Προσθήκη Profile Team A module και Profile Team B module
- Προσθήκη Settings Team A module και Settings Team B module
 Άρα τα τυπικά υποέργα που προστίθενται είναι:
- Verification module
- Select Category module
- Submit Home module
- House Preferences module
- Profile module
- Settings module

Επίσης, αναγκαστικά αλλάξαμε τις εξαρτήσεις και τον χρονοπρογραμματισμό των εποέργων με αποτέλεσμα να σχεδιάζουμε εκ νέου τα διαγράμματα Pert και Gantt. Η προσθήκη υποέργων επηρέασε και την ανάθεση στο ανθρώπινο δυναμικό αφού πρέπει να μοιραστούμε ισοδύναμα το αυξημένο φόρτο εργασίας.

Τέλος, αλλαγές έγιναν και στην εκτίμηση κόστους. Προσθέσαμε το κόστος για το marketing του έργου.

• Τυπικά υποέργα

Παλιός πίνακας περιγραφής τυπικών υποέργων (ν0.1):

| Τυπικό υποέργο | Περιγραφή τυπικού υποέργου |
|----------------|-------------------------------------|
| TY1 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΕΩΝ |
| TY2 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ |
| TY3 | ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
| TY4 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
| TY5 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ GUI |
| TY6 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ |
| TY7 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ MODULES |
| TY8 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ |
| TY9 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ LOGIN MODULE |
| TY10 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SIGN-UP MODULE |
| TY11 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ QUESTIONNAIRE MODULE |
| TY12 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ HASHOME MODULE |
| TY13 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ LOOKINGFORHOME MODULE |
| TY14 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CHAT MODULE |
| TY15 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PAIRING MODULE |
| TY16 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ GUI |
| TY17 | ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΗΣ-ΚΩΔΙΚΑ |
| TY18 | ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΩΔΙΚΑ-GUI |
| TY19 | DEBUG |
| TY20 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ |

| Τυπικό υποέργο | Περιγραφή τυπικού υποέργου | |
|----------------|-------------------------------------|--|
| TY1 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΕΩΝ | |
| TY2 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ | |
| TY3 | ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | |
| TY4 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | |
| TY5 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ GUI | |
| TY6 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ | |
| TY7 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ MODULES | |
| TY8 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ | |
| TY9 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ LOGIN MODULE | |
| TY10 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SIGN-UP MODULE | |
| TY11 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ QUESTIONNAIRE MODULE | |
| TY12 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ VERIFICATION MODULE | |
| TY13 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SELECT_CATEGORY MODULE | |
| TY14 | YAOTOIHEH SUBMIT_HOME MODULE | |
| TY15 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ HOUSE_PREFERENCES MODULE | |
| TY16 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ PROFILE MODULE | |
| TY17 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SETTINGS MODULE | |
| TY18 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CHAT MODULE | |
| TY19 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ MATCHMAKING MODULE | |
| TY20 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ GUI | |
| TY21 | ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΗΣ-ΚΩΔΙΚΑ | |
| TY22 | ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΩΔΙΚΑ-GUI | |
| TY23 | DEBUG | |
| TY24 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | |

• Εξαρτήσεις τυπικών υποέργων

Παλιός πίνακας εξαρτήσεων τυπικών υποέργων (ν0.1):

| Τυπικό υποέργο | Προαπαιτούμενα τυπικά υποέργα |
|----------------|--|
| TY1 | - |
| TY2 | TY1 |
| TY3 | TY2 |
| TY4 | TY2 |
| TY5 | TY4 |
| TY6 | TY4 |
| TY7 | TY4 |
| TY8 | TY6 |
| TY9 | TY7 |
| TY10 | TY7 |
| TY11 | TY7 |
| TY12 | TY7 |
| TY13 | TY7 |
| TY14 | TY7 |
| TY15 | TY7 |
| TY16 | TY5 |
| TY17 | TY8, TY9, TY10, TY11, TY12, TY13, TY14, TY15 |
| TY18 | TY16, TY17 |
| TY19 | TY17, TY18 |
| TY20 | TY18,TY19 |

| Τυπικό υποέργο | Προαπαιτούμενα τυπικά υποέργα |
|----------------|---|
| TY1 | - |
| TY2 | TY1 |
| TY3 | TY2 |
| TY4 | TY2 |
| TY5 | TY4 |
| TY6 | TY4 |
| TY7 | TY4 |
| TY8 | TY6 |
| TY9 | TY7 |
| TY10 | TY7 |
| TY11 | TY7 |
| TY12 | TY7 |
| TY13 | TY7 |
| TY14 | TY7 |
| TY15 | TY7 |
| TY16 | TY7 |
| TY17 | TY7 |
| TY18 | TY7 |
| TY19 | TY7 |
| TY20 | TY5 |
| TY21 | TY8, TY9, TY10, TY11, TY12, TY13, TY14, |
| | TY15,TY16,TY17,TY18, TY19 |
| TY22 | TY20, TY21 |
| TY23 | TY21,TY22 |
| TY24 | TY22,TY23 |

• Χρονοπρογραμματισμός τυπικών υποέργων

Παλιός πίνακας χρονοπρογραμματισμού τυπικών υποέργων (ν0.1):


| Τυπικό Υποέργο | Διάρκεια (σε μέρες) | Έναρξη | Λήξη |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| TY1 | 1 | 1/3/2023 | 1/3/2023 |
| TY2 | 1 | 1/3/2023 | 1/3/2023 |
| TY3 | 1 | 1/3/2023 | 1/3/2023 |
| TY4 | 3 | 2/3/2023 | 4/3/2023 |
| TY5 | 3 | 7/3/2023 | 9/3/2023 |
| TY6 | 4 | 10/3/2023 | 13/3/2023 |
| TY7 | 5 | 16/3/2023 | 20/3/2023 |
| TY8 | 10 | 23/3/2023 | 1/4/2023 |
| TY9 | 2 | 2/4/2023 | 3`/4/2023 |
| TY10 | 2 | 4/4/2023 | 5/4/2023 |
| TY11 | 3 | 6/4/2023 | 8/4/2023 |
| TY12 | 3 | 9/4/2023 | 11/4/2023 |
| TY13 | 4 | 12/4/2023 | 15/4/2023 |
| TY14 | 8 | 12/04/2023 | 19/04/2023 |
| TY15 | 4 | 19/4/2023 | 22/4/2023 |
| TY16 | 9 | 23/4/2023 | 1/5/2023 |
| TY17 | 9 | 2/5/2023 | 10/5/2023 |
| TY18 | 9 | 11/5/2023 | 19/5/2023 |
| TY19 | 8 | 20/5/2023 | 27/5/2023 |
| TY20 | 6 | 28/5/2023 | 2/6/2023 |

| Τυπικό Υποέργο | Διάρκεια (σε μέρες) | Έναρξη | Λήξη |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| TY1 | 1 | 1/3/2023 | 1/3/2023 |
| TY2 | 1 | 1/3/2023 | 1/3/2023 |
| TY3 | 1 | 1/3/2023 | 1/3/2023 |
| TY4 | 3 | 2/3/2023 | 4/3/2023 |
| TY5 | 3 | 5/3/2023 | 7/3/2023 |
| TY6 | 4 | 8/3/2023 | 11/3/2023 |
| TY7 | 4 | 12/3/2023 | 15/3/2023 |
| TY8 | 8 | 16/3/2023 | 23/3/2023 |
| TY9 | 3 | 24/3/2023 | 26/3/2023 |
| TY10 | 3 | 27/3/2023 | 29/3/2023 |
| TY11 | 4 | 30/4/2023 | 2/4/2023 |
| TY12 | 4 | 3/4/2023 | 6/4/2023 |
| TY13 | 2 | 7/4/2023 | 8/4/2023 |
| TY14 | 3 | 9/4/2023 | 11/4/2023 |
| TY15 | 3 | 12/4/2023 | 14/4/2023 |
| TY16 | 5 | 15/4/2023 | 19/4/2023 |
| TY17 | 5 | 20/4/2023 | 24/4/2023 |
| TY18 | 4 | 25/04/2023 | 28/04/2023 |
| TY19 | 5 | 29/4/2023 | 3/5/2023 |
| TY20 | 8 | 4/5/2023 | 11/5/2023 |
| TY21 | 8 | 12/5/2023 | 19/5/2023 |
| TY22 | 8 | 20/5/2023 | 27/5/2023 |
| TY23 | 7 | 28/5/2023 | 2/6/2023 |
| TY24 | 2 | 3/6/2023 | 4/6/2023 |


• Διαγράμματα Gantt και Pert

Τα παρακάτω διαγράμματα Gantt και Gantt αποτελούν μία ρεαλιστική απεικόνιση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου εάν ξεκινάγαμε πραγματικά από την Τετάρτη 01/03/2023 να το υλοποιούμε.Το <u>Gantt</u> σχεδιάστηκε με το **Microsoft Project** και το <u>Pert</u> με το **Microsoft Visio**.


Παλιό διάγραμμα Gantt (v0.1):

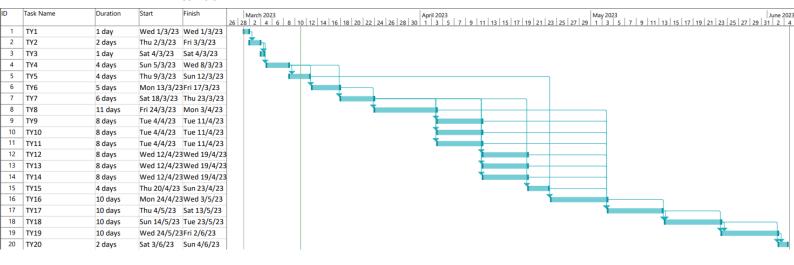


Νέο διάγραμμα Gantt (v0.2):

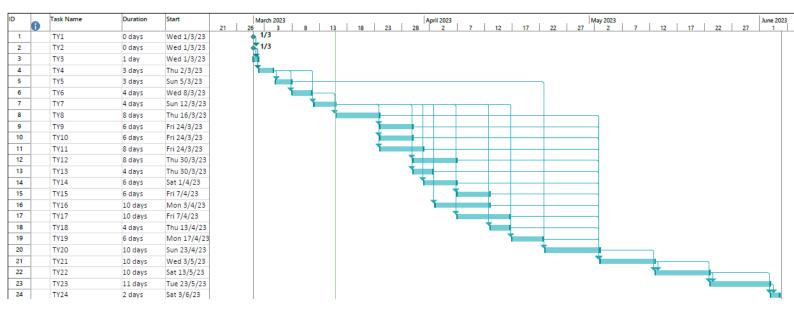

Παλιό διάγραμμα Pert (v0.1):

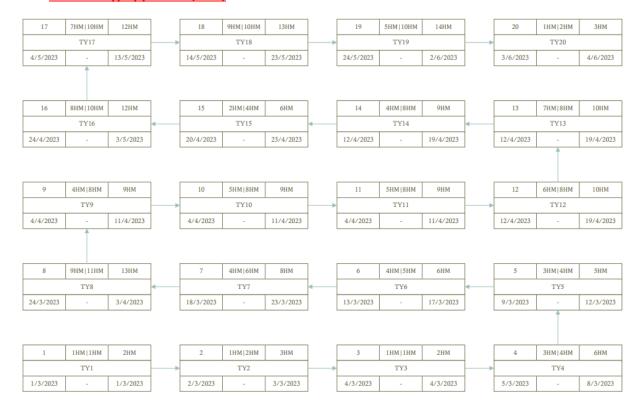

Νέο διάγρμμα Pert (v0.2):

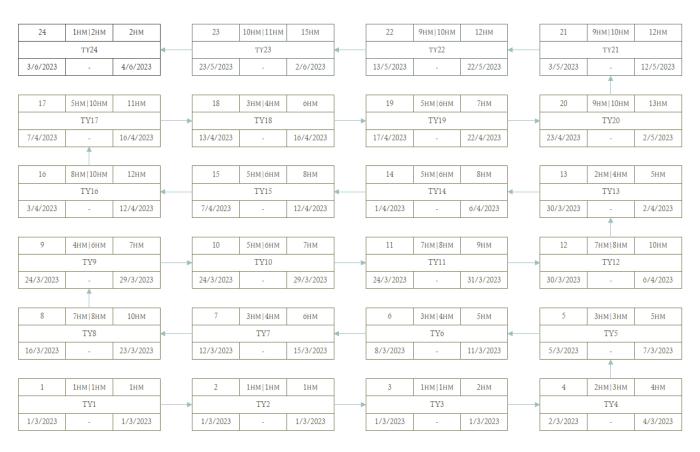


• Ανάθεση έργου σε ανθρώπινο δυναμικό


Όπως έχει αναλυθεί και στο **Team-plan-v0.1** στην ενότητα μοντέλο εργασίας όλα τα μέλη της ομάδας έχουμε συμφωνήσει ομόφωνα ότι η προσπάθεια όλων μας θα είναι ισοδύναμη. Συνεπώς, η ανάθεση του έργου θα είναι ισομερώς μοιρασμένη σε όλους μας. Αυτό αποτυπώνεται και στα παρακάτω διαγράμματα Gantt διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για τον καθένα μας.

(Αγνοώντας αργίες, Σαββατοκύριακα και την παράταση μιας βδομάδας του 1^{ou} Παραδοτέου, εμείς ακολουθούμε το αρχικό μας πλάνο σαν να μην είχε δωθεί παράταση.)


Παλιό Gantt ανάθεσης έργου για Μελάνη Γιώργο (ν0.1):

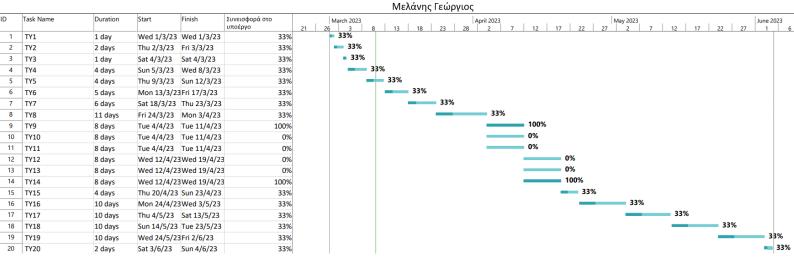


Νέο Gantt ανάθεσης έργου για Μελάνη Γιώργο (ν0.2):

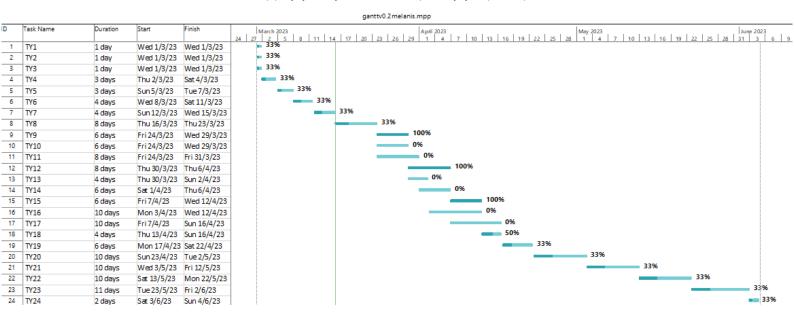


Παλιό Gantt ανάθεσης έργου για Ρέρρα Νικόλα (v0.1):

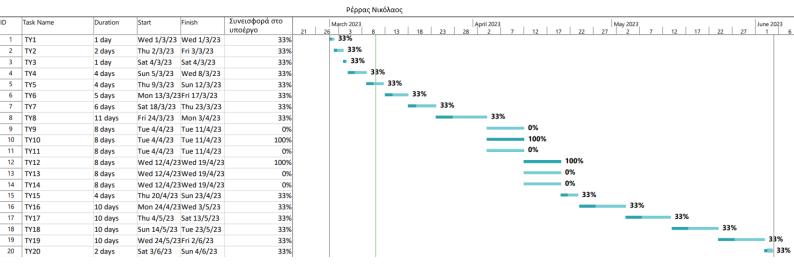


Νέο Gantt ανάθεσης έργου για Ρέρρα Νικόλα (ν0.2):

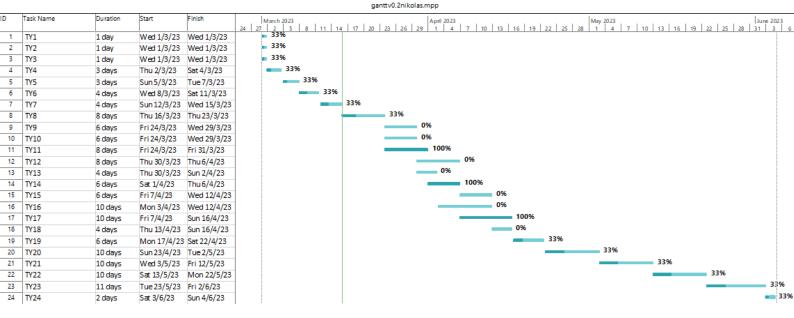

Παλιό Gantt ανάθεσης έργου για Ταμπαξή Γιώργο (v0.1):

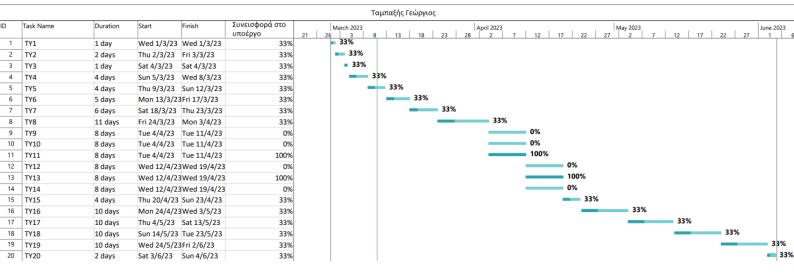

Νέο Gantt ανάθεσης έργου για Ταμπαξή Γιώργο (ν0.2):

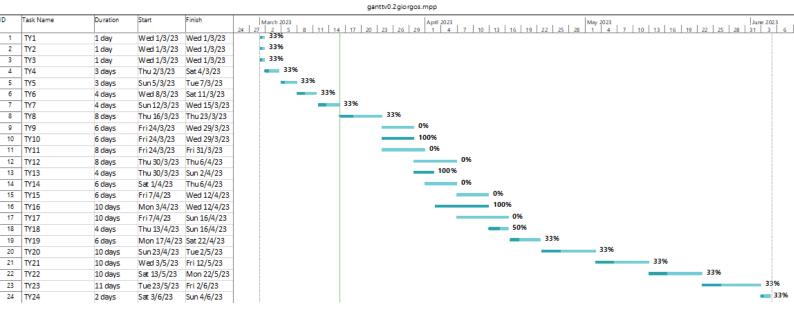

• Εκτίμηση κόστους

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με τα προβλεπόμενα έξοδα υλοποίησης του έργου μας. Για διευκρίνιση, με τον όρο Backup budget αναφερόμαστε σε ένα ποσό χρημάτων το οποίο θα μπορεί να διατεθεί άμεσα για να καλύψει κενά ή απρόσμενες αυξήσεις στα αρχικώς εκτιμώμενα κόστη.

Νέα προσθήκη στην έκδοση ν0.2 το κόστος Marketing.

| Περιγραφή κόστους | Εκτίμηση κόστους | Σύνολο |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| Μισθός 3 ατόμων για 3 μήνες | 1500€ ανά μήνα και άτομο | 13.500€ |
| Χώρος εργασίας για 3 μήνες | | |
| Ενοίκιο | 350€ ανά μήνα | 2.100€ |
| Πάγια έξοδα χώρου | 350€ ανά μήνα | |
| Λογισμικό | | |
| Microsoft 365 Subscription | 18,60€ ανά άτομο για 3 μήνες | |
| Microsoft Visio Subscription | 15€ ανά μήνα | 1.146€ |
| Microsoft Project Subscription | 55€ ανά μήνα | |
| Visual Studio Enterprise Subscription | 250€ ανά μήνα | |
| Αγορά Server | 2500€ | 2.500€ |
| Συντήρηση Συστημάτων | 500€ | 500€ |
| Marketing (Social Media) | | |
| Facebook Ads | 50€ ανά μήνα για 3 μήνες | 1.050€ |
| Instagram Ads | 150€ ανά μήνα για 3 μήνες | |
| Tik Tok Promotion | 150€ ανά μήνα για 3 μήνες | |
| Backup budget (ως εγγύηση σε | 1000€ | 1.000€ |
| περίπτωση που χρειαστεί) | | |
| | | 21.796€ |
